Inventaire du matériel et des structures

Extrait du registre, avec la nomenclature de la tour Layher

[Organisateur — à compléter] · version v5 du 2 novembre 2026 · 2026-11-02 · [contact — à compléter]

SOMMAIRE

1. Inventaire du matériel
2. Tour Layher Allround — nomenclature
3. Vues

1. Inventaire du matériel

Extrait du registre `evenement/registre.json` (42 objets actifs). Les quantités, poids et puissances marqués « à confirmer » sont des estimations ou des valeurs de classe de matériel.

MATÉRIEL (22)

Désignation	Qté	Dimensions (m)	kg	W	Fournisseur	Statut
Sanway D20K — ampli 4 canaux, 20 000 W (subs)	2	0.48 × 0.09 × 0.5	14	3000	NoName Prestation	a confirmer
Powersoft K10 — ampli 2 canaux (têtes TP-980)	3	0.48 × 0.09 × 0.45	12	1800	NoName Prestation	a confirmer
D4×3000 — ampli 4 × 3 000 W (front-fill, retours)	1	0.48 × 0.09 × 0.45	12	1500	NoName Prestation	a confirmer
Armoires : TGBT 125 A tri + coffrets son jardin / cour 63 A + coffret lumière · stands 63 A	4	1.2 × 1.8 × 0.6	80	0		a confirmer
Passages de câbles au sol — ≈ 280 m (dont ≈ 125 m roulables 5 voies dans les couloirs pompiers, ≈ 30 m 2 voies piétons dans le public)	280	1.0 × 0.07 × 0.5	12	0		a confirmer
GrandMA3 Command Wing — console lumière (onPC)	1	0.6 × 0.1 × 0.4	8	100	NoName Prestation	a confirmer
Pioneer DDJ-1000 — contrôleur DJ (hayon et scène)	2	0.7 × 0.07 × 0.36	6	30	NoName Prestation	a confirmer
T-Rack DSP 408 — 4 entrées / 8 sorties (système principal)	1	0.48 × 0.045 × 0.25	3	30	NoName Prestation	a confirmer
T-Rack DSP 306 — 3 entrées / 6 sorties (délais, calage)	1	0.48 × 0.045 × 0.25	3	30	NoName Prestation	a confirmer
Groupe électrogène 100 kVA insonorisé (option, si le coffret forain de la Ville est insuffisant)	1	3.2 × 2.2 × 1.5	2500	0		a confirmer
Laser RGB 10 W	2	0.4 × 0.24 × 0.4	?	600		a confirmer
Starway Mode B — barre LED 150 W, 16 canaux DMX	12	1.0 × 0.1 × 0.1	4	150	NoName Prestation	a confirmer
PAR 64 LED	12	0.25 × 0.35 × 0.25	3	100	NoName Prestation	a confirmer

Shure SM58 (+ pieds, câbles XLR)	8	0.05 × 0.16 × 0.05	0.3	0	NoName Prestation	a confirmer
Behringer X32 — console numérique 32 entrées	1	0.9 × 0.2 × 0.53	21	120	NoName Prestation	a confirmer
EPM-8 — retour DJ (hayon)	2	0.4 × 0.35 × 0.3	12	0	NoName Prestation	a confirmer
KAMA TP-980 — élément line array (têtes principales et délais)	12	0.9 × 0.3 × 0.55	38	0	NoName Prestation	a confirmer
T24N — tête 2 × 12" + 3", 1 400 W AES (front-fill et retours catwalk)	6	0.75 × 0.45 × 0.5	38	0	NoName Prestation	a confirmer
Soundboks — enceinte autonome (coulisses / repos)	1	0.43 × 0.66 × 0.32	15	0	NoName Prestation	a confirmer
SACH118 — sub 1 × 18", 1 700 W AES, 141 dB (fabrication maison Sound Agency / NoName)	16	0.6 × 0.7 × 0.75	60	0	NoName Prestation	a confirmer
Totem lumière 5,5 m (mât + embase lestée) — porte 2 × Mode B + 2 × PAR 64 LED	4	1 × 5.5 × 1	45	0		a confirmer
Tri-DLP laser 40 000 lm 4K (classe)	2	0.62 × 0.42 × 0.7	?	4200	Novelty (à confirmer)	a confirmer

STRUCTURES (6)

Désignation	Qté	Dimensions (m)	kg	W	Fournisseur	Statut
Camion 20 m³ avec hayon — garé en long devant la façade : flanc = écran, hayon déployé = plateau DJ	1	7.3 × 3.15 × 2.2	3500	?		a confirmer
Régie étanche — conteneur 20' aménagé (vitre, clim), surélevé de 1,20 m sur praticables	1	6.06 × 2.59 × 2.44	2300	3000		a confirmer
Tour VP Layher Allround — 3 travées × 3,07 m, 1 × 3,07 m de profondeur, 5 niveaux de 2 m, plancher à 10,3 m, garde-corps, bâche de toit	1	9.21 × 12.9 × 3.07	2600	?		a confirmer
Podium-catwalk 1,50 m — tête 6 × 4 m + passerelle 2,4 × 12 m (praticables), 2 escaliers latéraux, garde-corps, jupes imprimées, bandes LED	1	6 × 2.6 × 16	1800	?		a confirmer
Tonnelle 3 × 3 m	8	3 × 3 × 3	25	?		a confirmer
Tonnelles repos (6 × 3) et stockage (3 × 3) derrière la tour + bâche opaque 14 m	2	6 × 2.5 × 3	40	?		a confirmer

STANDS (8)

Désignation	Qté	Dimensions (m)	kg	W	Fournisseur	Statut
Prévention	1		?	?		a confirmer
Poste de secours	1		?	?		a confirmer
Accueil · infos	1		?	?		a confirmer
Buvette	1		?	?		a confirmer
Restauration	1		?	?		a confirmer
Asso 1	1		?	?		a confirmer
Asso 2	1		?	?		a confirmer
Asso 3	1		?	?		a confirmer

PERSONNES (RÔLES) (2)

Désignation	Qté	Dimensions (m)	kg	W	Fournisseur	Statut
Régie vidéo / mapping	2		?	?		a confirmer
Opérateur laser certifié	1		?	?		a confirmer

CONTRAINTES (2)

Désignation	Qté	Dimensions (m)	kg	W	Fournisseur	Statut
Chantier tour nord (mars 2025 → ~2030), échafaudage > 90 m côté nord			?	?		a confirmer
Extinction de l'éclairage public pendant le show			?	?		a confirmer

DOCUMENTS (1)

Désignation	Qté	Dimensions (m)	kg	W	Fournisseur	Statut
Book NoName Prestation — parc son, lumière, DJ (25 p.)			?	?		a confirmer

2. Tour Layher Allround — nomenclature


Géométrie : 3 travées de 3,07 m × 1 travée de 3,07 m, embase à 0,30 m, 5 niveaux de 2,00 m, plancher à 10,30 m, garde-corps à 0,50 et 1,00 m, plinthes, toit bâché à 12,90 m, VP à 10,80 m (lentille), lasers à 11,40 m sur trépieds.

Pièce	Réf. Layher	Qté	Statut de la référence
Montant Allround 2,00 m	2603.200	44	famille 2603.xxx citée (DOC0345) ; longueur à confirmer
Montant Allround 1,00 m	2603.100	8	idem
Embase (collier de départ)	2602.000	8	citée (DOC0345)
Vérin de pied 0,60 m	4001.060	8	citée (DOC0345)
Moise O 3,07 m	2607.307	70	citée (brochure Allround NL) ; LW : 2601.307
Moise U 3,07 m (support planchers)	2611.307	6	à confirmer
Diagonale 3,07 × 2,00 m	2620.307	40	famille 2620.xxx citée (DOC0345)
Plancher acier LW 3,07 × 0,32 m	3883.307	27	série 3883 citée (FIS 64, 19,3 kg)
Plancher acier 3,07 × 0,19 m	—	3	à confirmer
Plancher à trappe + échelle alu 3,07 × 0,61 m	—	5	à confirmer
Plinthe 3,07 m	—	8	Allround à confirmer (Blitz : 1757.307)
Lest béton ≈ 1 t, sanglé	hors Layher	8	note de calcul au vent
Bâche de toit + filet + fixations	hors Layher	1	démontage au-delà de 50 km/h

Sources consultées : notice Layher étaiement Allround DOC0345 (socles 4001.060, embases 2602.000, montants 2603.xxx, diagonales 2620.xxx) — https://www.layher.nl/-/media/layher/documentatie/06-ondersteuning/french/fr-traditionele-kopspindel-badding-ondersteuningen-ar-doc0345-0621.pdf ; fiche Layher France FIS 64 plancher acier LW (série 3883) — https://www.layher.fr/permadoc/FIS_64_Plancher_acier_LW.pdf ; brochure Layher Allround (moise 2607.307) — https://steigerhuur.nl/wp-content/uploads/2017/01/brochure_schoorsteensteigers.pdf ; fiche garde-corps Layher (moise LW 2601/xxx, plinthe 1757/xxx) — https://www.layher.nl/-/media/layher/documentatie/04-systeemvrij-accessoires/french/fr-leuningklem-dakrandbeveiliging-doc0016.pdf ; catalogue « Layher Éléments » (juin 2021) à consulter pour trancher — https://www.layher.fr/wp-content/uploads/2024/05/layher_elements_juin_2021.pdf. Les sites Layher n'étaient pas joignables depuis l'environnement de travail : les références non confirmées suivent la

numérotation Layher (famille.longueur en cm) et doivent être validées par le loueur avant commande.

3. Vues

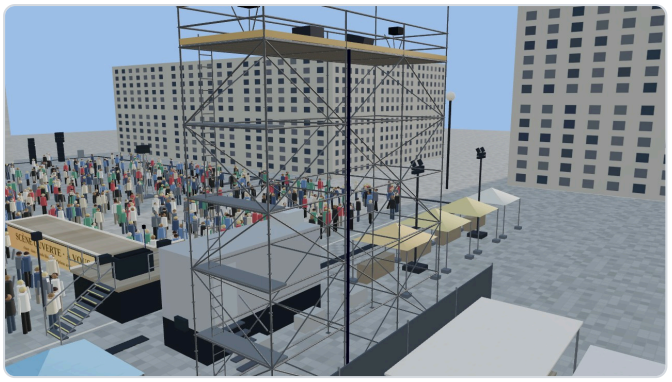

La tour Layher Allround 3 × 3,07 m, plancher à 10,3 m, lests, échelles, tronc de câbles



Le camion 20 m³ garé en long : écran sur le flanc, DJ sur le hayon (19 h 30)

Document de travail généré depuis le dépôt du projet (exports/generer_exports.py). Les mentions « à compléter » et « à confirmer » sont à traiter avant envoi. Les volumes des bâtiments voisins sont indicatifs ; la maquette vérifie la géométrie, elle ne remplace ni la commission de sécurité, ni les notes de calcul, ni les déclarations.
