Fiche de déclaration — rassemblement et soirée sur le parvis

Résumé pour la mairie, la préfecture et les services (à compléter puis joindre le dossier technique)

[Organisateur — à compléter] · version v5 du 2 novembre 2026 · 2026-11-02 · [contact — à compléter]

SOMMAIRE

1. Identification et nature de l'événement
2. Plan et vue d'ensemble
3. Jauges et puissance
4. Dispositif de sécurité et de prévention

1. Identification et nature de l'événement

Rubrique	Réponse
Intitulé	**[à compléter]** — soirée sur le parvis de la basilique Saint-Denis : rassemblement des collectifs, scène ouverte, défilé, concerts, mapping vidéo sur la façade
Organisateur	**[structure, SIRET, adresse — à compléter]**
Responsable sur place	**[nom, téléphone joignable toute la soirée — à compléter]**
Lieu	parvis de la basilique Saint-Denis (93200), façade occidentale ; espace public, domaine de la Ville ; monument : Centre des monuments nationaux
Date	**[date — à compléter]** ; montage dès **[heure]**, public de 18 h à 0 h 40, parvis rendu avant 2 h
Nature	manifestation sur la voie publique avec sonorisation, podium, projection sur monument, lasers ; sans billetterie, sans barrières, accès libre
Jauge	5 424 personnes à 2 pers/m² sur 2 712 m² nets (maximum 8 136 à 3 pers/m²) — jauge retenue avec la Ville : **[à compléter]**
Déclarations liées	déclaration de manifestation (préfecture), autorisation d'occupation du domaine public (Ville), accord CMN / DRAC (projection), déclaration DGAC (lasers), arrêté d'extinction de l'éclairage public 22 h → 23 h 20, dérogation horaires sonorisation

Dispositif en quelques lignes


- **Implantation** : tout au centre du parvis, dans l'axe — camion-écran devant la façade, zone public 52 × 54 m, podium-catwalk de 1,50 m qui entre dans le public, régie et tour vidéo (plancher à 10,3 m) à 64–72 m, village de 8 tonnelles sur les flancs, repos et électricité derrière. Voir le plan joint.
- **Sécurité** : zone sans barrières tenue par **[n] agents** et un marquage au sol, poste de secours et prévention dans le village, **[n] secouristes / SSIAP]**, couloirs latéraux de 4 m libres pour les secours, tours de délai en îlots.
- **Son** : 4 piles de 4 subs + têtes + 2 délais ; **102 dB(A) et 118 dB(C) sur 15 min**, afficheur et enregistrement en régie ; sonorisation de 19 h 30 à **[heure de fin]**.
- **Vidéo et lasers** : 2 vidéoprojecteurs 40 000 lm et 2 lasers 10 W sur une tour d'échafaudage Layher à 70 m de la façade, faisceaux à plus de 9 m au-dessus du public, aucune fixation sur le monument, lasers sur la façade seule au-dessus de 5,5 m.
- **Électricité** : 53,5 kW appelés, TGBT 125 A tri raccordé au coffret forain **[à confirmer avec la Ville]** ou groupe électrogène 100 kVA insonorisé.
- **Structures** : tour Layher (note de calcul et PV de montage), podium praticables, tonnelles lestées, régie conteneur sur praticables, camion moteur coupé et calé.
- **Riverains** : information préalable **[date]**, horaires de l'arrêté, niveaux mesurés.

Pièces jointes

1. Dossier technique complet (implantation cotée, synoptiques, bilan électrique, inventaire).
2. Plan d'implantation générale et vues de la maquette.
3. Attestations à joindre : assurance RC organisateur **[à joindre]**, note de calcul et PV de montage de la tour **[monteur]**, calcul NOHD et certificat opérateur laser **[prestataire]**, fiches techniques son **[NoName Prestation]**, plan de prévention **[à joindre]**.

2. Plan et vue d'ensemble

Le plan coté complet est dans le dossier technique (section Implantation).

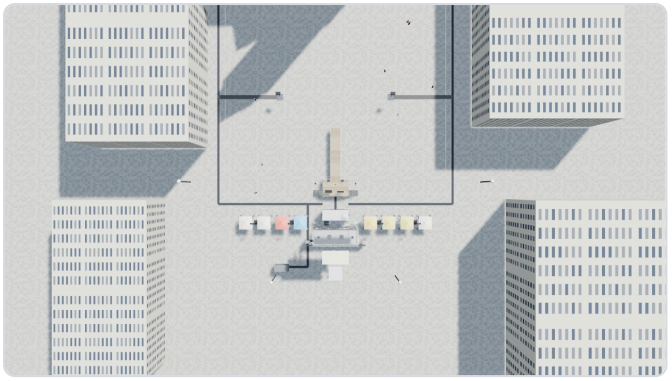

Plan de dessus de jour, échelle : la zone public fait 52 × 54 m



Vue d'ensemble du parvis en fin de montage (16 h) : tour Layher, régie, podium-catwalk, camion devant la façade, stands sur les flancs

3. Jauges et puissance

Poste	Appelé	Départ TGBT	Où
Son	14 kW	63 A tri	coffrets son jardin et cour, pieds de façade
Lumière	4,5 kW	32 A tri	coffret lumière · stands, derrière la tour côté cour
Vidéo (VP, serveur, écran camion, lasers)	12,5 kW	32 A tri	régie, tour, camion
Captation	1,5 kW	16 A mono	régie
Régie (clim, éclairage, onduleur)	3 kW	16 A tri	régie
Stands (8 × 2 kW)	16 kW	63 A tri	coffret lumière · stands
Repos, stockage, balisage, secours	2 kW	16 A mono	derrière la tour
Total appelé	**53,5 kW**	**TGBT 125 A tri (86 kVA)**	derrière la tour côté jardin

Source : **coffret forain de la Ville** s'il délivre 125 A tri, sinon **groupe électrogène 100 kVA insonorisé** (80 kW, charge prévue 67 %, ≈ 16 L/h, 160 L pour la soirée + réserve), placé derrière les stands côté jardin, hors vue, avec une zone d'exclusion de 2 m.

Jauges (calcul de la démo, grille au mètre) :

Espace	Surface	Jauge
Zone public nette (52 × 54 m moins podium + marges et îlots de délai)	2 712 m²	**5 424** à 2 pers/m² · 8 136 maxi à 3 pers/m² (ERP PA debout)
Flancs devant les stands (files, circulation)	161 m²	161 à 1 pers/m²
Plateau : tête 6 × 4 + catwalk 2,4 × 12	52,8 m²	35 en défilé (1,5 m²/pers), structure 500 kg/m²
Coulisses (entre podium et régie)	30 m²	30 artistes et régisseurs
Repos équipe	18 m²	9 assis
Hayon (plateau DJ)	3,5 m²	**2 personnes** (charge hayon ≈ 750 kg, à lire sur le véhicule)

La jauge de référence à déclarer est celle à 2 pers/m² ; la Ville et la préfecture peuvent imposer moins. Les couloirs latéraux (x = ±26 à ±30 m) restent libres sur 4 m pour les secours.

4. Dispositif de sécurité et de prévention

Public et circulation

- zone public de 2 712 m² nets, **sans barrières** : marquage au sol, agents aux angles, tours de délai en îlots tenus ; jauge de référence **5 424 personnes** à 2 pers/m², maximum réglementaire 8 136 à 3 pers/m² — la jauge déclarée est celle retenue avec la Ville ;
- **couloirs latéraux de 4 m** libres de part et d'autre (voies pompiers), passages de câbles roulables, sorties vers le métro et le tram ;
- plan de prévention préfecture, SSIAP et secouristes dimensionnés sur la jauge, poste de secours dans le village (côté jardin, visible dès l'axe), prévention et accueil à côté.

Podium-catwalk

- 1,50 m de haut, 500 kg/m², platelage antidérapant, jupe fermée, nez de scène éclairés ;
- garde-corps 1,10 m au fond et sur les côtés de la tête ; **catwalk sans garde-corps** (face jouée) : largeur 2,40 m, agents aux angles, lisses basses amovibles possibles — point à valider en commission de sécurité ;
- deux escaliers latéraux 1,20 m, marches 19 cm, mains courantes doubles, nez contrastés, éclairés ; un régisseur de plateau pendant le micro ouvert et le défilé ; jauge plateau 35 personnes en défilé ; accès PMR à trancher (plateforme élévatrice ou prise de parole au pied).

Camion et hayon

- moteur coupé, calage, extincteur, zone technique avant de 1,7 m tenue par des agents ;
- hayon déployé : charge lue sur la plaque du véhicule (≈ 750 kg) → **2 personnes maximum**, béquilles, garde-corps amovible côté arrière ;
- pas de DJ sur le hayon pendant le mapping (dans le cône du VP 1).

Tour et structures

- tour Layher Allround montée par une entreprise qualifiée : note de calcul au vent, lestage (≈ 8 t à confirmer), PV de montage, contrôle avant mise en service, bâche de toit démontée au-delà de 50 km/h ; accès par planchers à trappe et échelles ;
- tonnelles lestées 4 × 20 kg, toits démontés si vent fort ; régie surélevée sur praticables (charge au sol à vérifier).

Son, lumière, lasers, électricité

- niveaux **102 dB(A) et 118 dB(C) sur 15 minutes** (décret 2017-1244), afficheur et enregistrement en régie, information des riverains, horaires de l'arrêté ;
- wash de façade et totems hors du cône des VP, aucun faisceau vers les fenêtres riveraines ;

- lasers : classe et puissance déclarées, calcul NOHD du prestataire, zone d'exclusion sous 5,5 m sur la façade, **déclaration DGAC**, opérateur certifié sur la tour, arrêt d'urgence en régie ;
- installation électrique temporaire : un point de terre, différentiels 30 mA par départ, arrêt d'urgence général en régie et au TGBT, vérification par organisme agréé si demandée ;
- monument : accord écrit CMN / DRAC pour la projection, **aucune fixation** sur la basilique, emprise du chantier de la tour nord respectée.

Météo : seuils d'annulation ou de repli à fixer (vent : bâche de tour et toits de tonnelles ; pluie : régie étanche, machines sous toit bâché, lasers et VP protégés).

Document de travail généré depuis le dépôt du projet (exports/generer_exports.py). Les mentions « à compléter » et « à confirmer » sont à traiter avant envoi. Les volumes des bâtiments voisins sont indicatifs ; la maquette vérifie la géométrie, elle ne remplace ni la commission de sécurité, ni les notes de calcul, ni les déclarations.
